

峨眉至汉源高速公路 JC-4 标段

隧道监控量测项目



**峨汉高速 2-7 分部**

**大峡谷隧道出口端监控量测月报**

(2018.9.20~2018.10.20)

上海同济检测技术有限公司

峨汉高速 JC-4 项目部

二〇一八年十月二十日

# 峨眉至汉源高速公路 JC-4 标段

## 大峡谷隧道监控量测月报

建设单位：四川乐汉高速公路有限责任公司

设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院

施工单位：四川公路桥梁建设集团有限公司

检测单位：上海同济检测技术有限公司

检测人员：

报告编写：

报告审核：

上海同济检测技术有限公司

峨汉高速 JC-4 项目部

二〇一八年十月二十日

# 目 录

第一章 施工及监测概况.....	4
1.1 工程概况.....	4
1.2 大峡谷隧道施工进度图 .....	5
1.3 大峡谷隧道本月施工概况 .....	5
1.4 大峡谷隧道监控量测本月工作完成情况 .....	6
1.5 监控量测实施依据.....	6
第二章 监控量测内容、频率及布点示意图.....	7
2.1 主要内容.....	7
2.2 量测频率.....	7
第三章 变形监测项目管理基准.....	8
第四章 量测资料整理与分析.....	9
4.1 拱顶下沉.....	9
4.2 周边位移.....	10
第五章 监测异常情况.....	12
5.1 大峡谷隧道拱顶下沉异常情况 .....	12
5.2 大峡谷隧道净空收敛异常情况 .....	12
第六章 结论与建议.....	13
6.1 大峡谷隧道结论： .....	13
6.2 大峡谷隧道建议： .....	13
第七章 附图 .....	14
附图一：大峡谷隧道拱顶下沉及周边收敛曲线（附图 1-1～14-1； 1-2～14-2） .....	14
附图二：大峡谷隧道地质及支护状态观察记录附表.....	14



# 第一章 施工及监测概况

## 1.1 工程概况

大峡谷隧道进口位于乐山市金口河区文店村枕头坝水电站江沟料场上游边界，岔河右岸斜坡中部，出口位于乌斯河镇对面凉山自治州甘洛县乌史大桥乡尔苦滩村边尔苦滩沟右岸机耕道边坡上，隧道穿越大渡河右岸贝母山山体，测区地处四川盆地西缘，为盆地向青藏高原东部的过渡地带，整体地势西高东低，地表起伏大，地形崎岖，峰峦重迭，气势雄伟，河谷幽深，壁垂千仞，高差悬殊，隧道穿越的山体浑厚，山势陡峻，峡谷纵横，大渡河由隧道出口外在路线左侧呈弧形流经隧道进口附近向东而去。隧道附近的最高海拔大于 3000m，最低点为隧道出口外的大渡河，海拔约 657.6m，相对高差近 2500m，属高山峡谷地貌区。

大峡谷隧道左线起止桩号为 ZK74+940~ZK87+045，全长 12105m，纵坡为 0.60/5935.00-1.00/6170.00，最大埋深为 1944.27；隧道右线起止桩号为 K74+884~K87+030，全长 12146m，纵坡为 0.60/5976.00-1.00/6170.00，最大埋深为 1931.88m。

大峡谷隧道横洞起止桩号为 TK0+475~TK0+000，全长 475m，纵坡为-4.4966%，最大埋深为 240m。

大峡谷隧道峨眉端斜井起点为：ASK0+000，终点为 ASK2+272，斜井全长 2272m，纵坡为 13.80%，最大埋深为 1273m。

大峡谷隧道汉源端斜井起点为：BSK0+000，终点为 BSK2+046 全长 2046m，最大纵坡为 10.84%，最大埋深为 1209m。

表 1.1 大峡谷隧道设置情况

序号	隧道名称	隧道类型	起讫桩号	隧道长度（m）
1	大峡谷隧道	分离式、特长隧道	ZK74+940~ZK87+045	12105
			K74+884~K87+030	12146



图 1.1 大峡谷隧道出口右洞洞门照



图 1.2 大峡谷隧道出口左洞洞门照



## 1.2 大峡谷隧道施工进度图

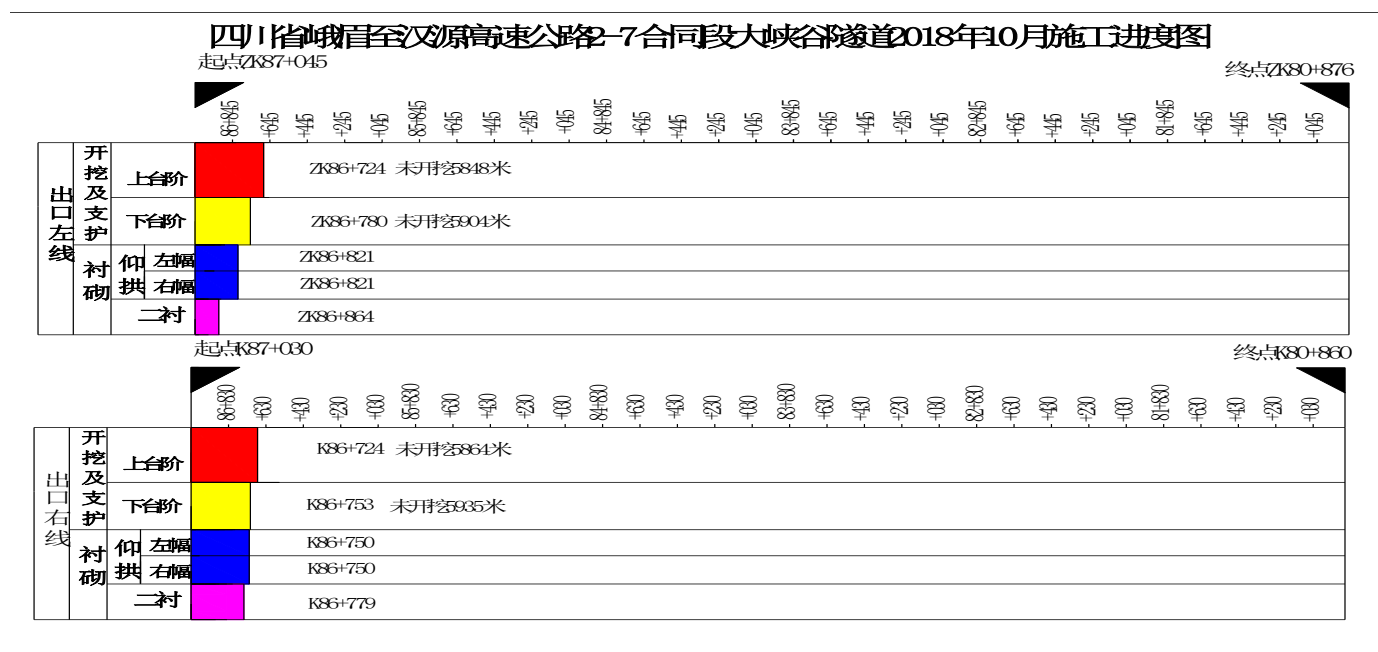


图 1.3 大峡谷隧道施工进度形象图

## 1.3 大峡谷隧道本月施工概况

截止 2018 年 10 月 20 日，大峡谷隧道本月施工进度情况如下表所示。

表 1.2 大峡谷隧道施工进度情况一览表

名称 施工工序		9 月 20 日	10 月 20 日	本月进尺(m)	累计进尺(m)	备注
出口左线	上台阶	ZK86+826	ZK86+724	102	321	
	下台阶	ZK86+885	ZK86+780	105	265	
	仰拱铺设	ZK86+905	ZK86+821	84	224	
	二衬浇筑	ZK86+973	ZK86+864	109	181	
出口右线	上台阶	K86+735	K86+724	11	306	
	下台阶	K86+795	K86+753	42	277	
	仰拱铺设	K86+808	K86+757	51	273	
	二衬浇筑	K86+839	K86+779	60	251	



## 1.4 大峡谷隧道监控量测本月工作完成情况

表 1.3 大峡谷隧道断面布设及超前预报统计表

隧道名称	监测项目	本月完成	累计完成
大峡谷隧道	地质超前预报	8 期	37 期
	地质及支护观察	31 次	152 次
	拱顶沉降	5 个断面	40 个断面
	周边位移	5 个断面	40 个断面
	地表沉降	0 个断面	4 个断面

## 1.5 监控量测实施依据

- (1) 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)；
- (2) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)；
- (3) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)；
- (4) 《工程测量规范》(GB50026-2007)；
- (5) 《铁路隧道监控量测技术规程》(Q/CR 9218-2015)；
- (6) 《工程岩体分级标准》(GB 50218-2008)；
- (7) 《铁路隧道喷锚构筑法技术规则》(TB 10108-2002)；
- (8) 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)；
- (9) 《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)；
- (10) 《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)；
- (11) 隧道工程施工图设计文件等相关资料；
- (12) 国家其他相关技术规范。
- (13) 我单位从事其它隧道工程监控量测项目取得的经验。



## 第二章监控量测内容、频率及布点示意图

### 2.1 主要内容

(1) 周边收敛：根据变形的速率及量值判断围岩的稳定程度，选择适当的二次衬砌支护时机，指导现场施工。

(2) 拱顶下沉：根据量测数据确认围岩的稳定性，判断支护效果，指导施工工序预防坍塌，保证隧道施工安全。

(3) 地表沉降：对隧道埋深较浅段进行地表沉降监测，判定隧道开挖对地表的影响，与拱顶下沉数据相互印证。

(4) 地质和初期支护状况观测：预测开挖面前方的地质条件，为判断围岩、隧道的稳定性提供地质依据，根据喷层表面状态及锚杆的工作状态，分析支护的可靠程度。

### 2.2 量测频率

大峡谷隧道周边收敛、拱顶下沉、地表沉降量测频率见表 2.1，地质和初期支护状况观测开挖完成后进行。

表 2.1 监控量测频率一览表

按变形速率	量测频率	按到开挖面的距离 (m)	量测频率
$\geq 5\text{mm/d}$	2~3 次/天	(0~1) b	2 次/1 天
1~5mm/d	1 次/天	(1~2) b	1 次/1 天
0.5~1mm/d	1 次/2~3 天	(2~5) b	1 次/2~3 天
0.2~0.5mm/d	1 次/3 天	$> 5b$	1 次/3~7 天
$< 0.2$	1 次/3~7 天	/	/
安全巡视	开挖时及其他量测时观察		

注：1、b—隧道开挖宽度。

2、量测频率主要根据位移速度和距离开挖面的距离而定，并取两者中频率高的。

3、监测精度 $\Delta h=0.1\text{mm}$ 。



### 第三章 变形监测项目管理基准

根据《铁路隧道监控量测技术规程》及铁路监控量测标准化实施细则，针对隧道监控量测，建立监测变形管理等级标准，管理等级分三等，其等级划分及相应基准值见表 3.1。通过对监测结果的比较和分析来判定支护结构的稳定性和安全性，并指导施工。

**表 3.1 变形管理等级标准表**

管理等级	管理位移	施工状态
III	$U_0 < U_n / 3$	正常施工
II	$U_n / 3 \leq U_0 \leq 2U_n / 3$	加强支护
I	$U_0 > 2U_n / 3$	采取特殊措施

注： $U_0$  为实测变形值， $U_n$  允许变形值。 $U_n$  的确定： $U_n$  的确定应考虑围岩类别、隧道埋置深度等因素并结合现场条件选择。

**表 3.2 位移管理等级**

安全等级		正常（绿色）	预警二级（黄色）	预警一级（红色）	备注
支护等级	Db（400）	$<133$	133~266	$>266$	不包括高低应力软岩和膨胀岩隧道
	T5（150）	$<50$	50~100	$>100$	
	X5a、X5b、Z5b、T4（120）	$<40$	40~80	$>80$	
	Z5d（100）	$<33$	33~66	$>66$	
	Z4b（80）	$<26$	26~53	$>53$	
	Z4d（60）	$<16$	16~33	$>33$	

注：表中数值为预警累计值，单位均为毫米；表中“~”包括上、下限制。

**表 3.3 措施对应表**

安全等级	处理措施
正常绿色	正常施工
预警二级（黄色）	加强监测，必要时采取网喷混凝土等措施进行补强
预警一级（红色）	暂停施工，增设横竖支撑进行抢险，后续施工时，需加强支护，调整施工工法。

① 测点位移速率 $\geq 5\text{mm/d}$ 时，由监理工程师组织施工现场分析原因并采取处理措施；

② 当速率连续两天 $\geq 10\text{mm/d}$ 时，由监理单位组织施工单位进行原因分析和制定措施并上报建设单位批准；

当速率 $\geq 15\text{mm/d}$ 时，由建设单位组织设计、监理和施工单位进行原因分析和制定措施。





## 第四章 量测资料整理与分析

为了方便叙述和分析，报告作如下统一规定：拱顶沉降或地表测点上扬变形、周边收敛变形伸长，都以“+”表示；拱顶下沉及收敛，以“-”表示。

### 4.1 拱顶下沉

隧道沉降测点布置图如图 4.1 所示。

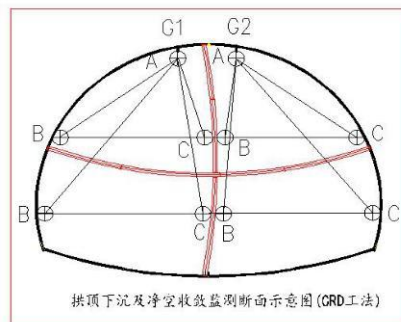
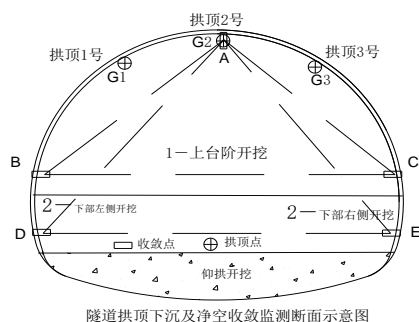


图 4.1 隧道拱顶下沉测点布置图

拱顶下沉监测断面示意图 (CRD 工法)

其具体变化情况见表 4.1、表 4.2。

表 4.1 大峡谷隧道出口左线拱顶下沉汇总表 (单位: mm)

断面里程	测点名称						变化趋势	附图 序号
	本月下沉量			累计下沉量				
	△G1	△G2	△G3	ΣG1	ΣG2	ΣG3		
ZK86+935	0.3	-0.1	-0.4	-6.0	-8.1	-4.6	二衬覆盖	1-1
ZK86+918	-0.2	-0.2	-0.4	-6.4	-7.6	-2.5	二衬覆盖	2-1
ZK86+891	0.4	-0.1	0.2	-0.8	-4.7	-5.0	二衬覆盖	3-1
ZK86+883	-1.1	-1.6	-0.5	-5.8	-6.4	-4.6	二衬覆盖	4-1
ZK86+864	-1.0	-1.9	-0.9	-5.7	-4.5	-4.9	二衬覆盖	5-1
ZK86+847	-1.1	-2.5	-1.5	-2.4	-3.3	-2.3	趋势平稳	6-1
ZK86+821	-2.4	-2.0	-1.7	-2.4	-2.0	-1.7	趋势平稳	7-1
ZK86+804	-2.0	-2.8	-1.9	-2.0	-2.8	-1.9	趋势平稳	8-1
ZK86+783	-1.5	-2.9	-1.3	-1.5	-2.9	-1.3	趋势平稳	9-1
ZK86+764	-0.9	-1.8	-0.7	-0.9	-1.8	-0.7	趋势平稳	10-1



## 数据分析:

本月隧道左线拱顶沉降监测数据变化较为平稳,无异常数据。其中,本月变化较大的为 ZK86+804 断面,G1 测点本月下沉-2.0mm;G2 测点本月下沉-2.8mm;G3 测点本月下沉-1.9mm。总体趋势平稳。

表 4.2 大峡谷隧道出口右线拱顶下沉汇总表(单位: mm)

断面里程	测点名称						变化趋势	附图 序号
	本月下沉量			累计下沉量				
	$\triangle G1$	$\triangle G2$	$\triangle G3$	$\sum G1$	$\sum G2$	$\sum G3$		
K86+819	-0.2	-0.2	0.3	-4.8	-3.8	-3.3	二衬覆盖	11-1
K86+789	-1.1	-0.7	-1.0	-2.8	-3.8	-2.2	二衬覆盖	12-1
K86+769	-0.7	-2.7	-1.8	--2.4	-7.1	-5.4	趋势平稳	13-1
K86+747	-2.9	-1.9	-1.9	-4.1	-3.2	-2.4	趋势平稳	14-1

## 数据分析:

本月隧道右线拱顶沉降监测数据变化较为平稳,无异常数据。其中,变化较大的为 K86+747 断面,G1 测点本月下沉-2.9mm; G2 测点本月下沉-1.9mm; G3 测点本月下沉-1.9mm。总体趋势平稳。

## 4.2 周边位移

隧道周边位移测点布置图如图 4.2 所示。


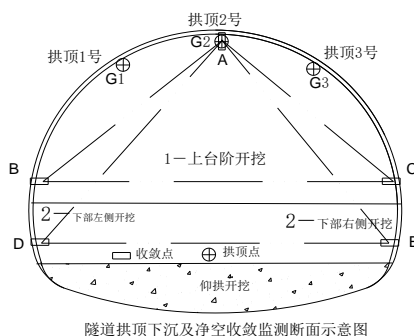


图 4.2 隧道周边位移测点布置图

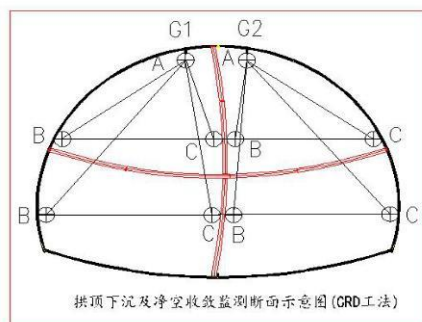

周边位移监测断面示意图 (CRD 工法)

表 4.3 大峡谷隧道出口左线初期支护收敛监测汇总表(单位: mm)

断面里程	测线名称		变化趋势	附图序号
	本月收敛值	累计收敛值		



	$\Delta AB$	$\Delta AC$	$\Delta BC$	$\Sigma AB$	$\Sigma AC$	$\Sigma BC$		
ZK86+935	-0.3	-0.2	-0.2	-6.5	-8.4	-8.1	二衬覆盖	1-2
ZK86+918	-0.3	-0.4	-0.4	-4.4	-5.8	-7.1	二衬覆盖	2-2
ZK86+891	-0.4	0.6	-0.5	-5.4	-1.5	-2.7	二衬覆盖	3-2
ZK86+883	-0.5	-0.4	-0.5	-0.9	-4.1	-3.5	二衬覆盖	4-2
ZK86+864	-0.5	-0.8	-1.3	-2.9	-3.5	-3.9	二衬覆盖	5-2
ZK86+847	-1.7	-0.4	-1.8	-3.0	-1.1	-4.2	趋势平稳	6-2
ZK86+821	-2.6	-3.1	-2.4	-2.6	-3.1	-2.4	趋势平稳	7-2
ZK86+804	-1.5	-2.6	-2.2	-1.5	-2.6	-2.2	趋势平稳	8-2
ZK86+783	-1.7	-2.2	-1.2	-1.7	-2.2	-1.2	趋势平稳	9-2
ZK86+764	-1.7	-1.8	-1.0	-1.7	-1.8	-1.0	趋势平稳	10-2

**数据分析:**

本月隧道左线净空收敛监测数据变化较为平稳, 无异常数据。其中, 变化较大的为 ZK86+821 断面, AB 测线本月收敛-2.6mm; AC 测线本月收敛-3.1mm; BC 测线本月收敛-2.4mm。总体趋势平稳。

表 4.4 大峡谷隧道出口右线初期支护收敛监测汇总表 (单位: mm)

断面里程	测线名称						变化趋势	附图 序号
	本月收敛值			累计收敛值				
	$\Delta AB$	$\Delta AC$	$\Delta BC$	$\Sigma AB$	$\Sigma AC$	$\Sigma BC$		
K86+819	0.2	-0.1	-0.3	-1.6	-2.0	-3.0	二衬覆盖	11-2
K86+789	-0.6	-1.1	-1.1	-6.0	-2.4	-5.4	二衬覆盖	12-2
K86+769	-2.4	-1.8	-1.9	-5.0	-3.5	-4.2	趋势平稳	13-2
K86+747	-0.6	-1.7	-3.6	-2.1	-3.3	-4.7	趋势平稳	14-2

**数据分析:**

本月隧道右线净空收敛监测数据变化较为平稳, 无异常数据。其中, 变化较大的为 K86+769 断面, AB 测线本月收敛-2.4mm; AC 测线本月收敛-1.8mm; BC 测线本月收敛-1.9mm。总体趋势平稳。



## 第五章 监测异常情况

### 5.1 大峡谷隧道拱顶下沉异常情况

本月隧道右线拱顶沉降监测数据变化较为平稳，无异常数据。其中，变化较大的为出口右线 K86+747 断面，G1 测点本月下沉-2.9mm；G2 测点本月下沉-1.9mm；G3 测点本月下沉-1.9mm.总体趋势平稳。

### 5.2 大峡谷隧道净空收敛异常情况

本月隧道左线净空收敛监测数据变化较为平稳，无异常数据。其中，变化较大的为出口左线 ZK86+821 断面，AB 测线本月收敛-2.6mm；AC 测线本月收敛-3.1mm；BC 测线本月收敛-2.4mm。总体趋势平稳



## 第六章 结论与建议

### 6.1 大峡谷隧道结论：

(1) 本月隧道拱顶下沉监测断面受掌子面开挖及地质条件影响较小，监测数据变化不大，无异常。

(2) 本月隧道周边位移监测数据变化不大，无异常数据。

(3) 本月地表沉降累计变化量较为平稳，无异常。

### 6.2 大峡谷隧道建议：

(1) 隧道左右洞开挖进尺缓慢，均为设计IV级，围岩自稳能力一般，完整性一般，拱顶支护不及时局部易产坍塌现象，建议开挖后及时支护。施工采用“短进尺、弱爆破、及时支护”的开挖方式，保持围岩稳定。

(2) 掌子面开挖过程中应做到随挖随支，严格控制进尺，加快下台阶、仰拱及二衬的施工工作，确保隧道施工安全。

(3) 目前施工处于岩溶发育段落，建议施工单位谨慎施工，如遇突发情况及时通知我地质超前预报监测单位及时采取措施。保证隧道施工安全。



## 第七章 附图

附图一：大峡谷隧道拱顶下沉及周边收敛曲线（附图 1-1~14-1；1-2~14-2）

附图二：大峡谷隧道地质及支护状态观察记录附表

附图一

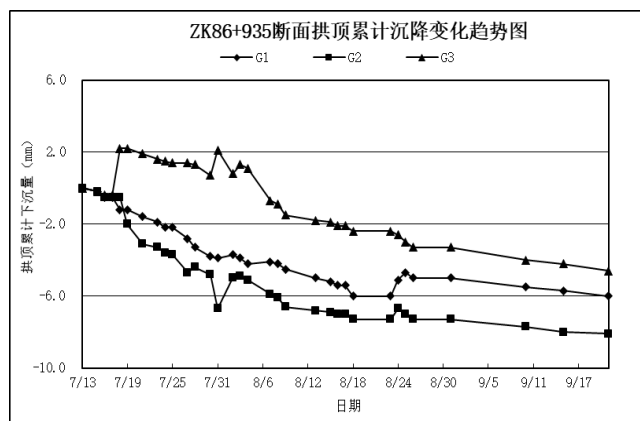


图 1-1

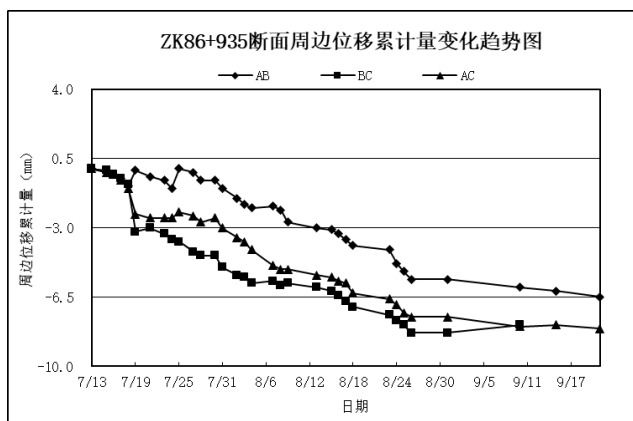


图 1-2

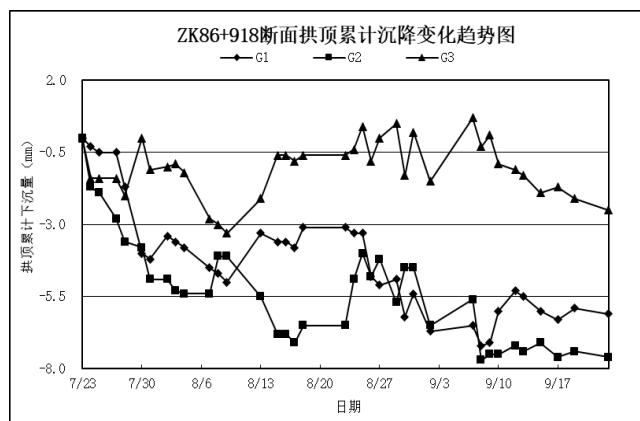


图 2-1

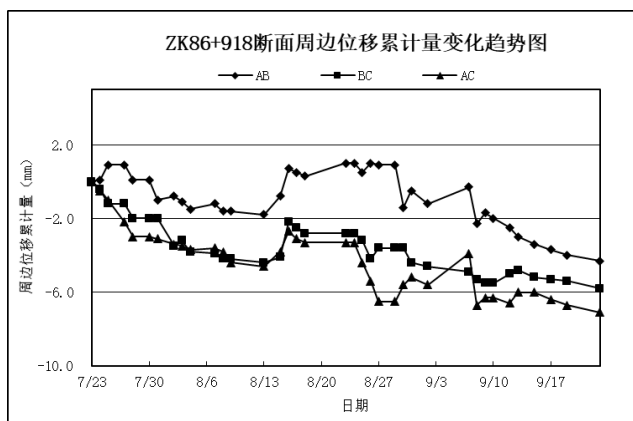


图 2-2

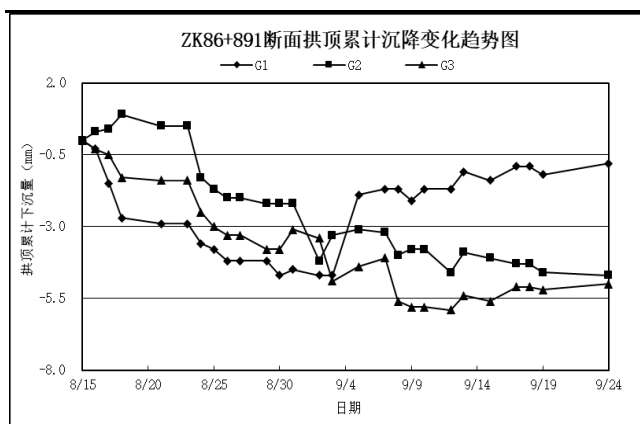


图 3-1

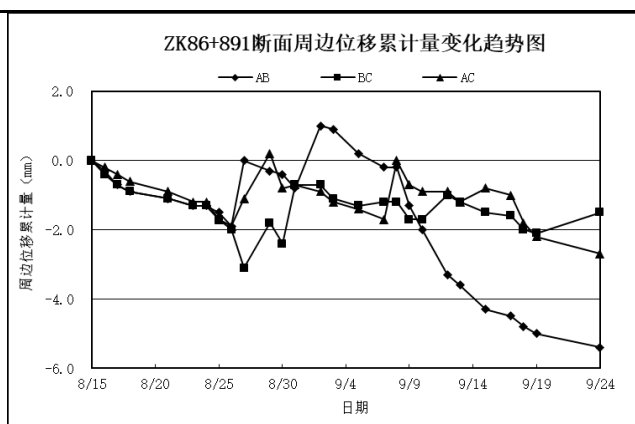


图 3-2

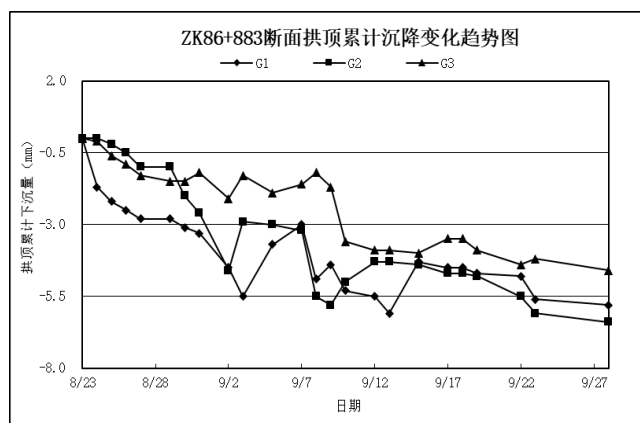


图 4-1

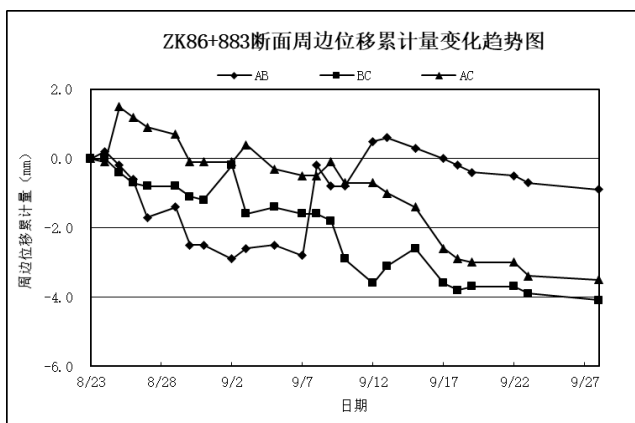


图 4-2

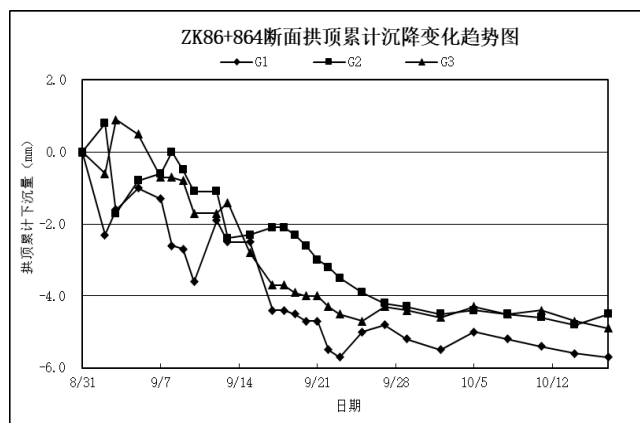


图 5-1

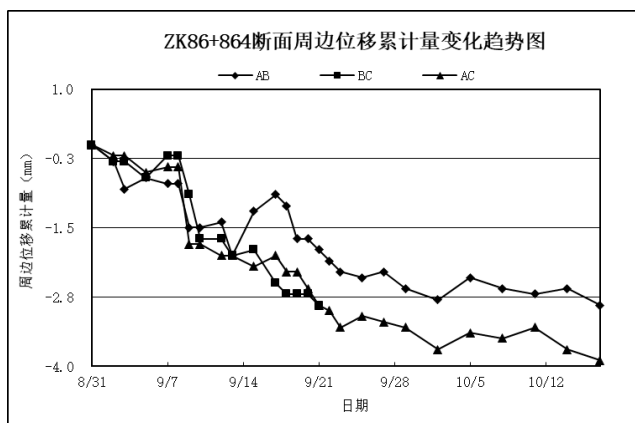


图 5-2

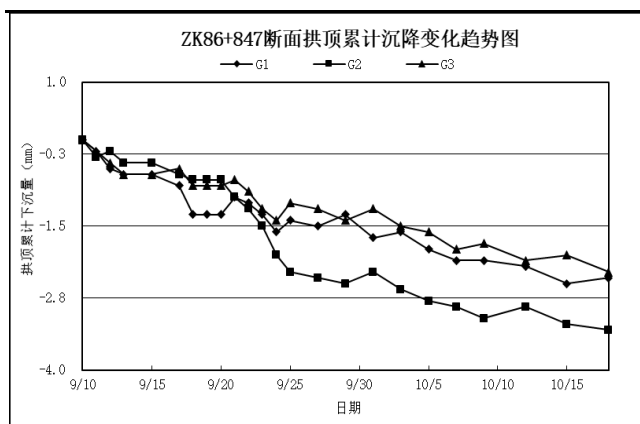


图 6-1

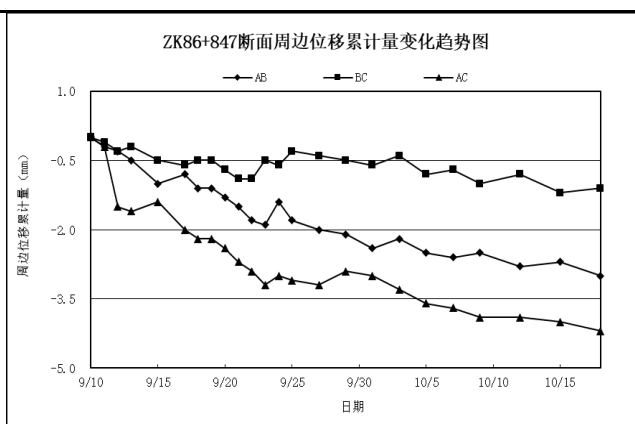


图 6-2

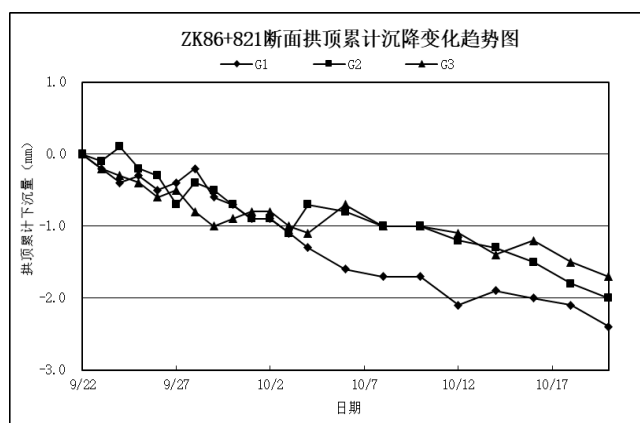


图 7-1

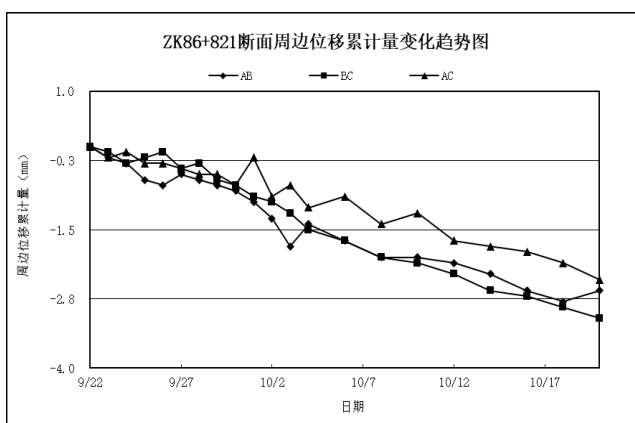


图 7-2

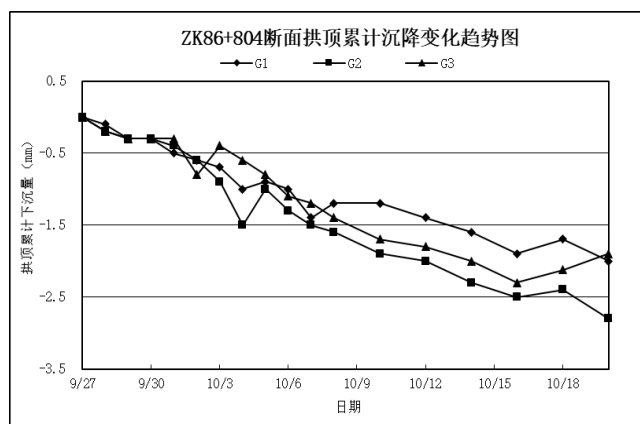


图 8-1

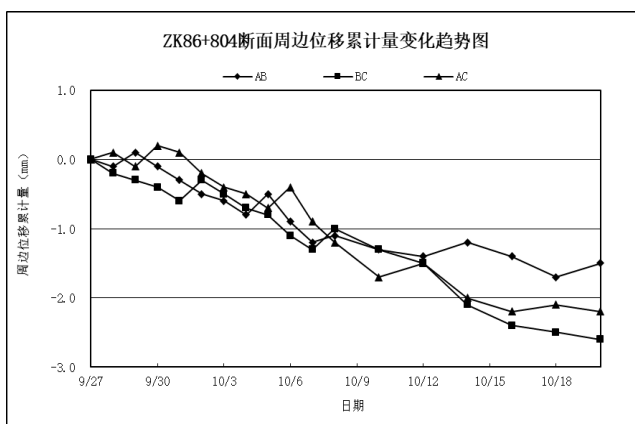


图 8-2



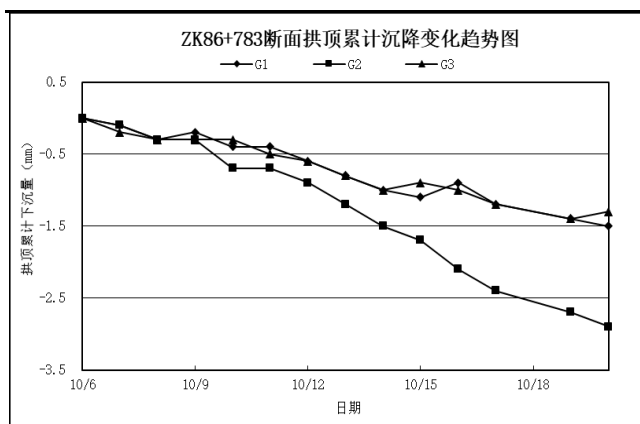


图 9-1

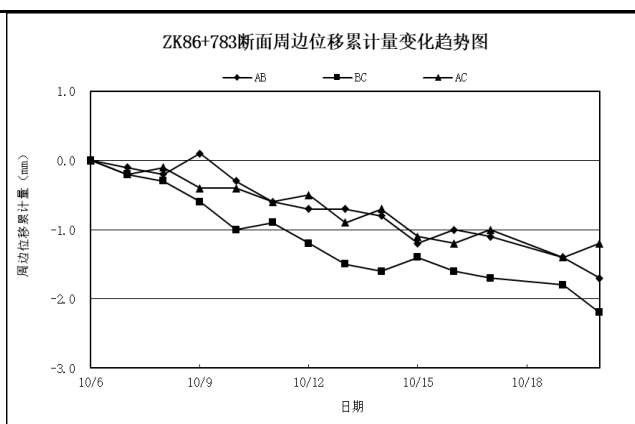


图 9-2

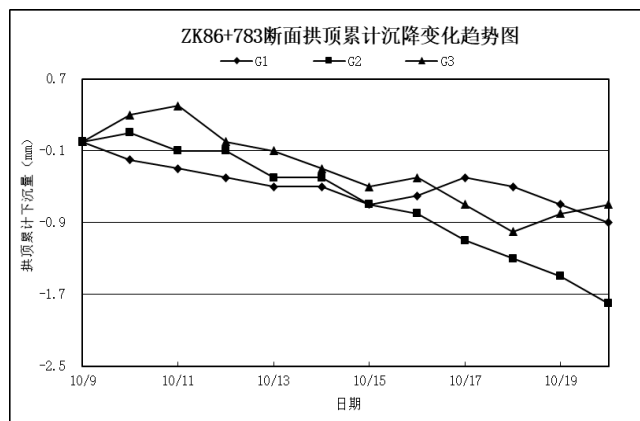


图 10-1

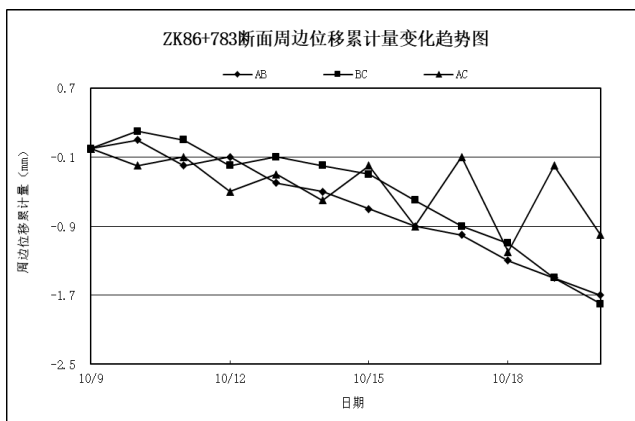


图 10-2

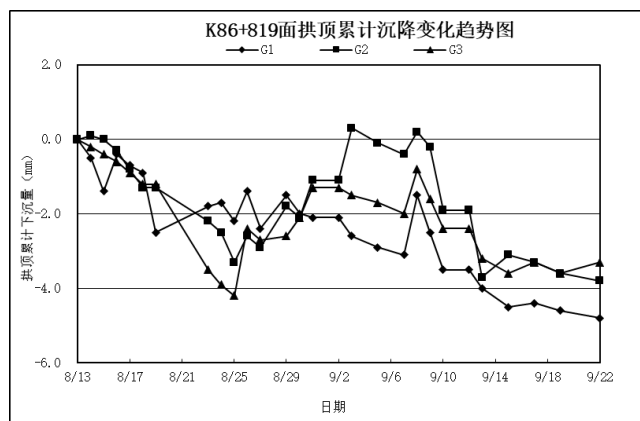


图 11-1

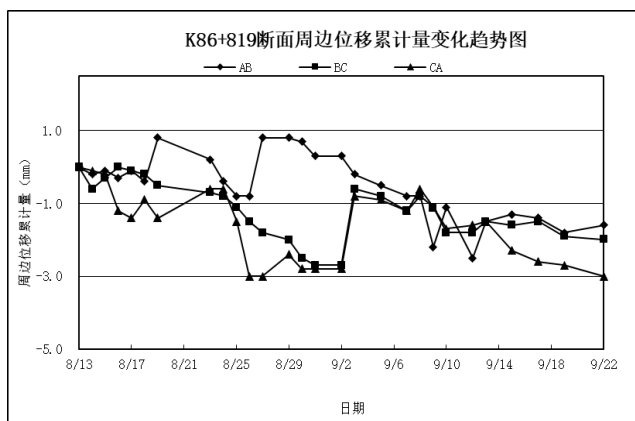


图 11-2

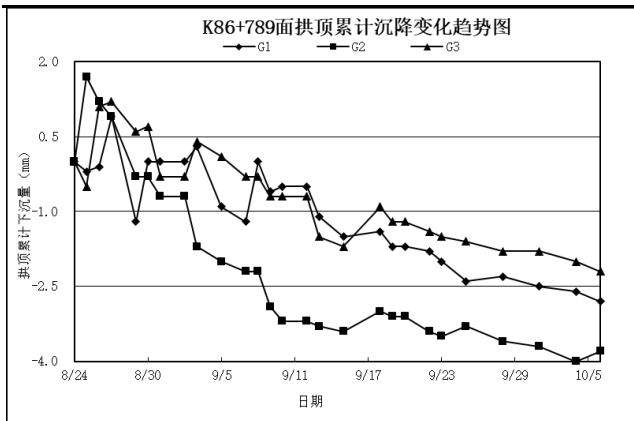


图 12-1

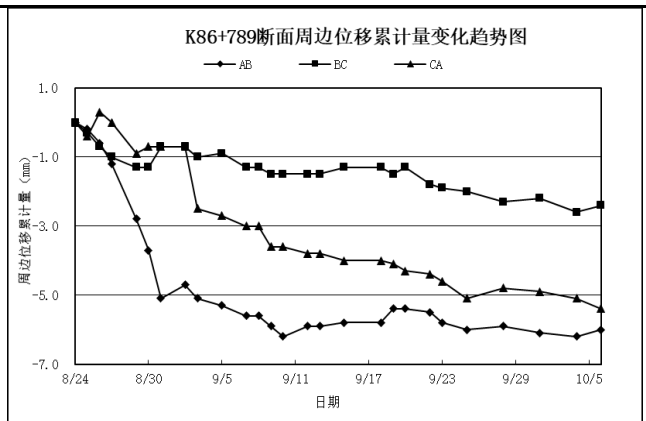


图 12-2

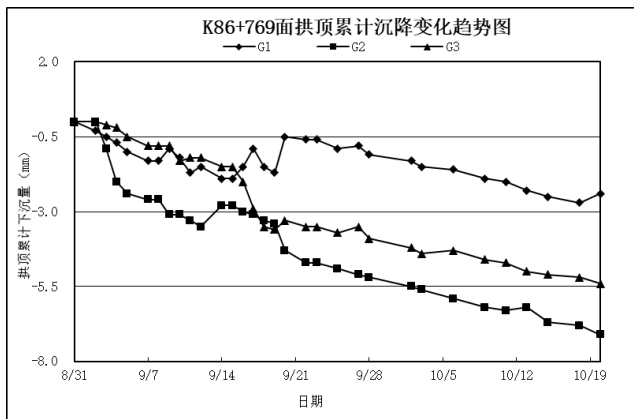


图 13-1

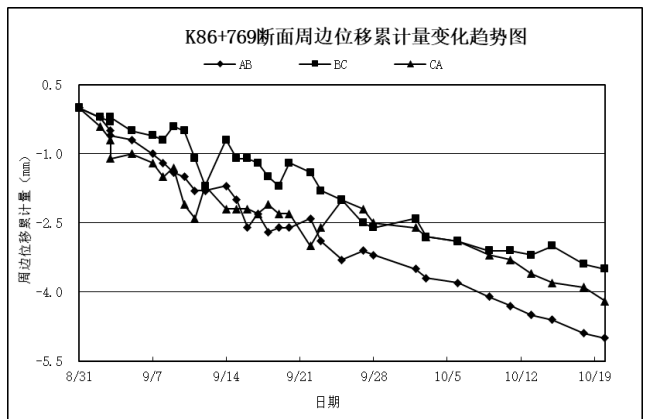


图 13-2

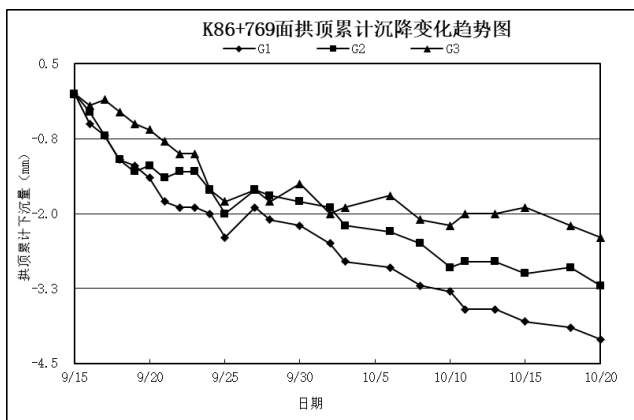


图 14-1

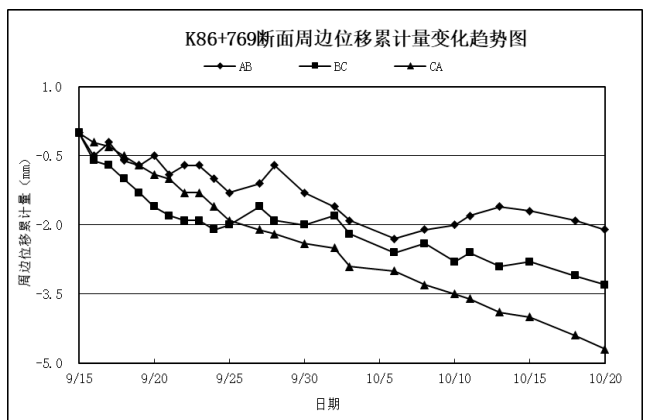



图 14-2



附图二

大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 20 日

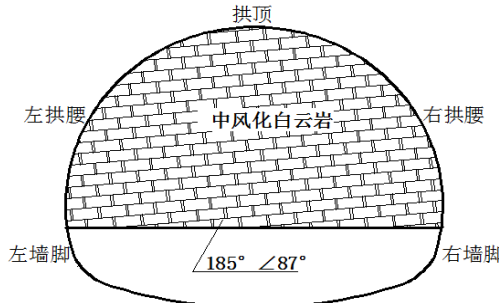隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+826	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—062	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		185° ∠87°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					



记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 21 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+821	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—063	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		190° ∠55°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状;		裂隙块状; 碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质素描图	<div>拱顶</div> <div>左拱腰</div> <div>中风化白云岩</div> <div>右拱腰</div> <div>左墙脚</div> <div>190° ∠55°</div> <div>右墙脚</div>					施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				



		备注	
--	--	----	--

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 22 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+816	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—064	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		190° ∠55°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
						√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
地质	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质	<div>拱顶</div> 					施工方法、主要支护措施及参数		新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。			



素描图		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。
		备注	

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 24 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+810	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—065	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		190° ∠65°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕		平整光滑			
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重			
地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水		
		√									
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											



地质素描图		施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。
		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。
		备注	

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 25 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+806	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—066		
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		190° ∠65°			
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩		
				√								
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状		
						√						
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）		
						√						
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎		
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重		
地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状		股状出水	涌、突水		
		√										

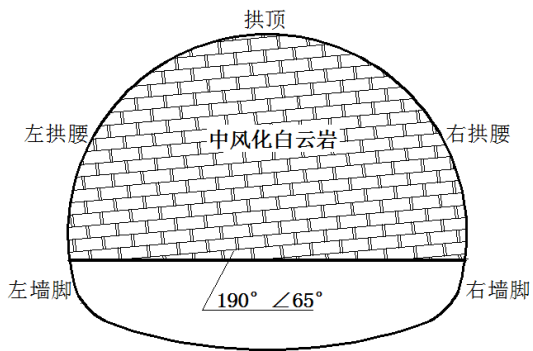

地质素描图	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）		
		施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。
		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。
		备注	

记录:

审核:


## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 26 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+802	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-067
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	191° ∠34°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状:		裂隙块状; 碎裂状	
	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
	发育程度(组数)					√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	无充填
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕		平整光滑	
地质构造影响程度		轻微	√	较重		严重		极严重	



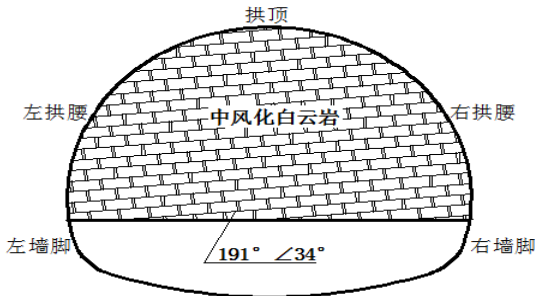

地质素描图	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水	淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
			√					
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）							
					施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
					隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。		
					备注			

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 27 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+797	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-068
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	191° ∠ 34°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状;		裂隙块状; 碎裂状	
						√			
	结构面发育程度(组数)	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
						√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙质充填		砂质充填		泥质充填	破碎
								无充填	√

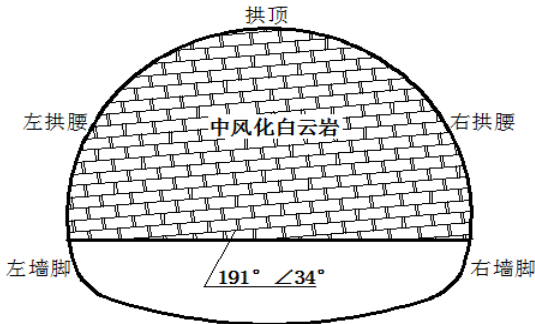

地质素描图	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕		平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
			√						
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）								
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。		
						备注			

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 29 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+792	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-069
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	191° ∠ 34°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状;		裂隙块状; 碎裂状	
						√			
结构面发育程度(组数)	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
						√			

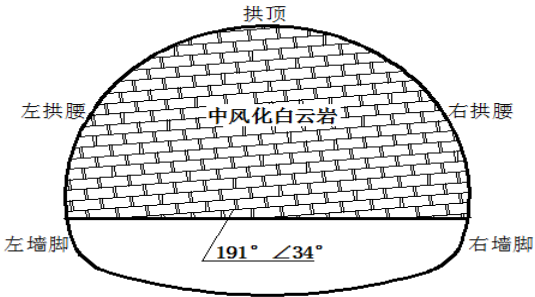

	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕		平整光滑			
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重			
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					

记录：


审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 09 月 30 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+792	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—070	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		191° ∠34°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于 3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	

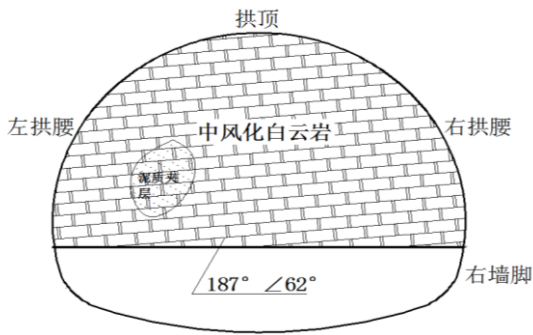

	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	有少量黄泥夹层。				
						备注					

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 01 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+787	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—071	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		191° ∠34°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	



	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）		
	发育程度(组数)					√						
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎		
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填		
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状		股状出水	涌、突水	
			√									
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											

地质素描图		施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。
		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	有少量黄泥夹层。
		备注	

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 02 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+782	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—072	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		188° ∠27°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							

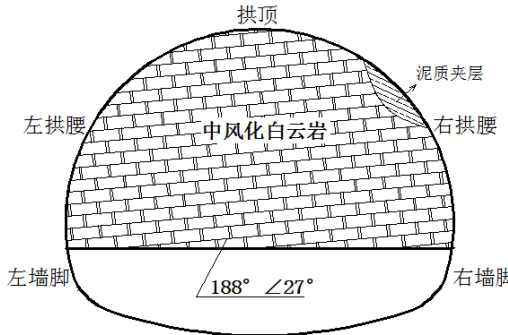

地质条件	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状：		裂隙块状：碎裂状		散体状	
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于 3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕			平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重			极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图					施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。					
					隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	有少量黄泥夹层。					
					备注						

记录：


审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 10 月 03 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+778	设计支护类型		Z4C		编号	DXG—CKZ—073		
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		188° ∠ 27°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定		

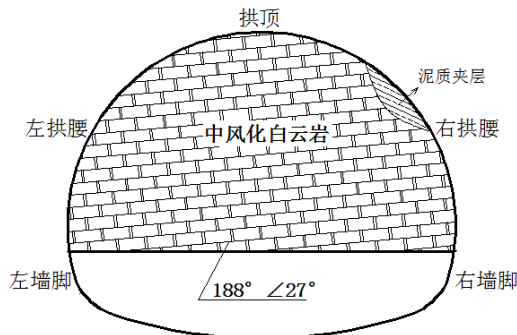

隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩 √		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状; √		裂隙块状; 碎裂状		散体状	
						√					
	结构面发育程度(组数)	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)		杂乱无章 (裂隙非常发育)	
						√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕			平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重			极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
	其他 (如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质)										
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工, 钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	有少量黄泥夹层。				
						备注					

记录：

审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 10 月 04 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+773	设计支护类型		Z4C		编号	DXG-CKZ-074
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	188° ∠27°	



围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波状	√	有擦痕		平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重		极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）									
	地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
隧道洞内、外地质及支护状况观察综述							有少量黄泥。			
备注										

记录:

审核:


## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 05 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+769	设计支护类型	Z4C	编号	DXG-CKZ-075
------	---------	----	---------	--------	-----	----	-------------



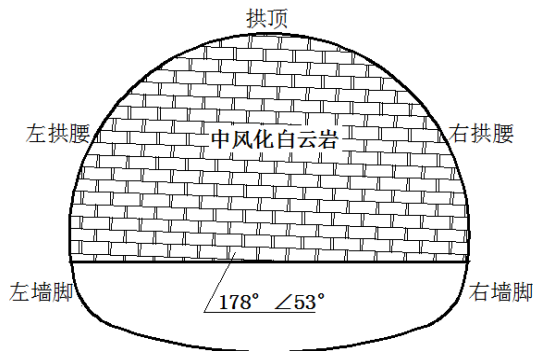

地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	178° ∠53°			
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
						√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重				极严重	
地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水		
	√										
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					

记录：

审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：

2018 年 10 月 06 日



隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+769	设计支护类型		Z4C		编号		DXG-CKZ-076	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	178° ∠53°			
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状:		裂隙块状; 碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)		杂乱无章 (裂隙非常发育)	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填		无充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重				极严重	
地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水		
	√										
其他 (如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质)											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工, 钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					


记录:

审核:

大峡谷隧道\_出口左洞\_开挖面地质素描记录表



日期: 2018 年 10 月 08 日

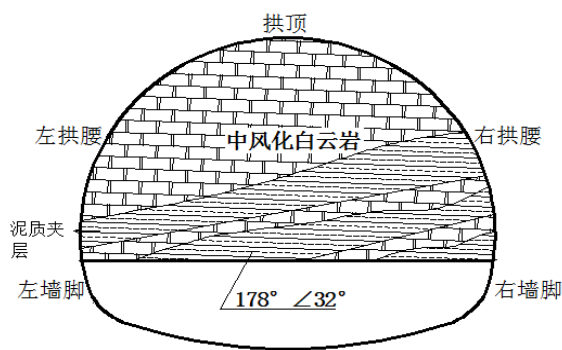隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+769	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—077	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		178° ∠53°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1～2（裂隙不甚发育）		2～3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面下方有部分泥质夹层。				
						备注					


记录:

审核:



## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 09 日

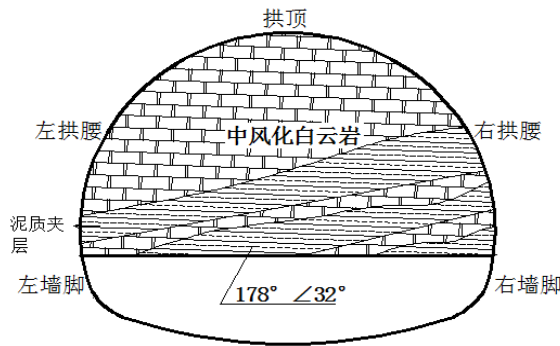隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+764	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—078	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		178° ∠53°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
		节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面下方有部分泥质夹层。				
						备注					




记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 10 日

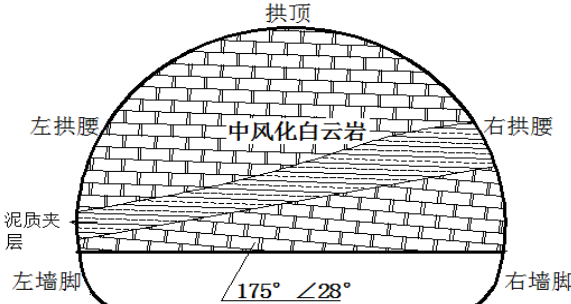隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+759	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—079	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		175° ∠28°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微		较重	√	严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。				



		备注	
--	--	----	--

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 11 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+754	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—080	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		175° ∠28°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
						√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状		股状出水	涌、突水	
		√									
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质	<div>拱顶</div> 					施工方法、主要支护措施及参数		新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。			



素描图		隧道洞内、外地质及支护状况观察 综述	掌子面中部有部分泥质夹层。
		备注	

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 12 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+750	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—081		
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		175° ∠28°			
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定			极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩		
				√								
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状		
						√						
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）		
						√						
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎		
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填		
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕				平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状		股状出水	涌、突水	
			√									
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											



地质素描图		施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。
		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。
		备注	

记录:

审核:


## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 13 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+746	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-082
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	172° ∠ 58°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状:		裂隙块状; 碎裂状	
						√			
	结构面发育程度(组数)	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
						√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√
地质构造影响程度	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕		平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水
			√						涌、突水



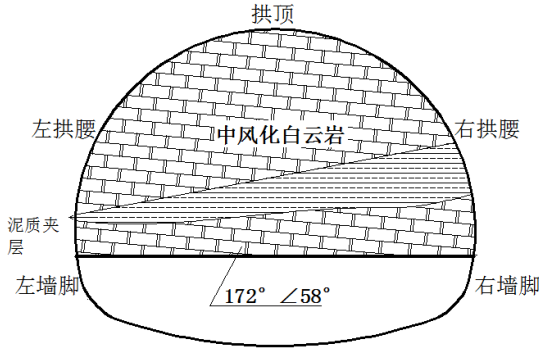

地质素描图	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）		
		施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。
		隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。
		备注	

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 15 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+740	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-083
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	172° ∠ 58°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状:		裂隙块状; 碎裂状	
						√			
	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
	发育程度(组数)					√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√
		明显台阶状		粗糙波状	√	有擦痕		平整光滑	
		轻微	√	较重		严重		极严重	

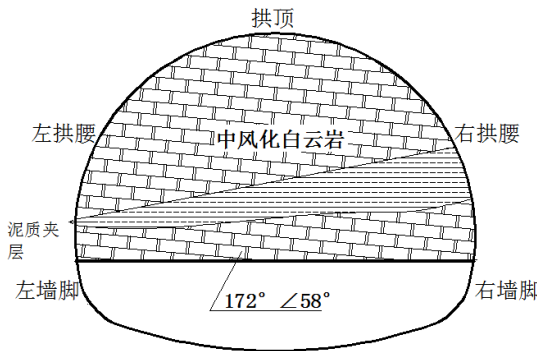

	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润 √	渗、滴水	淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）							
地质素描图					施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
					隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。		
					备注			

记录：


审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 10 月 16 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+736	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKZ—084	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		267° ∠62°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波状	√	有擦痕				平整光滑		

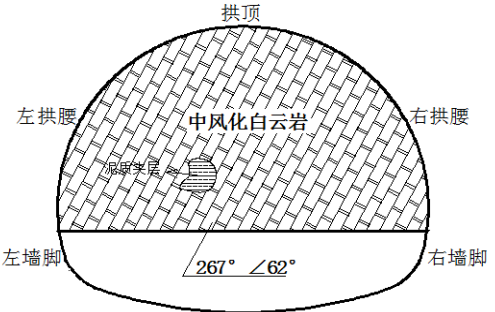

地质素描图	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
			√						
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）								
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。		
						备注			

记录：


审核：

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 10 月 17 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+731	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-085
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	267° ∠ 62°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状	
						√			
	结构面发育程度(组数)	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于 3（裂隙发育）	
						√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波状	√	有擦痕		平整光滑	

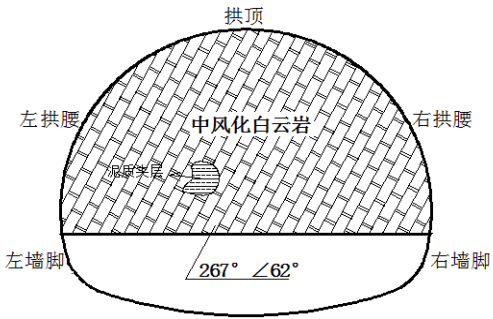

地质素描图	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
			√						
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）								
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有部分泥质夹层。		
						备注			

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 18 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+731	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-086
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	271° ∠ 65°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定	极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
				√					
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状:		裂隙块状; 碎裂状	
						√			
	结构面发育程度(组数)	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
						√			
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√
								破碎	
								无充填	

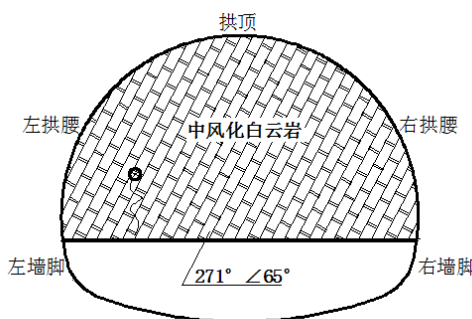

地质素描图	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕		平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状	线流状	股状出水	涌、突水
				√					
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）								
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。		
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面左侧有点滴状出水。		
						备注			

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 19 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+726	设计支护类型		Z4C		编号		DXG-CKZ-087
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	271° ∠65°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩
				√						
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状;		裂隙块状; 碎裂状		散体状
	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)		杂乱无章 (裂隙非常发育)
	发育程度(组数)					√				
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎

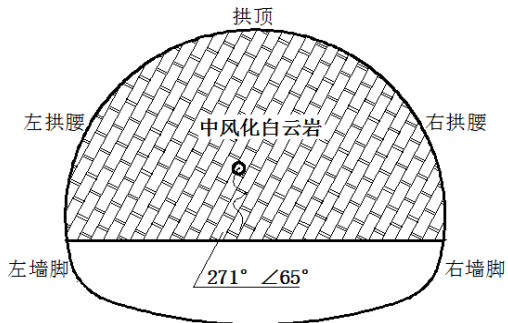

地质素描图	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕			平整光滑		
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重			极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
	其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）										
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有股状出水。				
						备注					

记录:

审核:

## 大峡谷隧道 出口左洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 10 月 20 日

隧洞名称	大峡谷出口左洞	桩号	K86+722	设计支护类型		Z4C	编号		DXG-CKZ-088
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状	271° ∠65°	
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状;		裂隙块状; 碎裂状	
	结构面	1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)	
	发育程度(组数)					√			



	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕		平整光滑			
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重			
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
									√		
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面中部有股状出水。				
						备注					

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口右洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 20 日

隧洞名称	大峡谷出口右洞	桩号	K86+735	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKY—061	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		209° ∠42°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	
						√					
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	

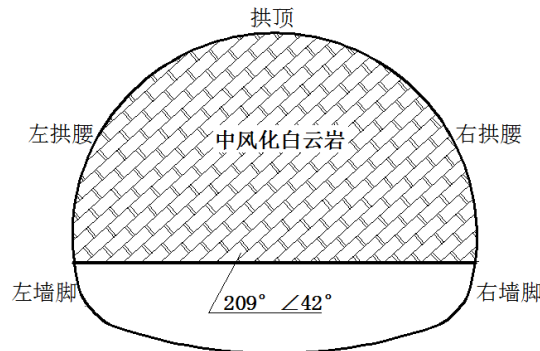

	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕		平整光滑			
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重		极严重			
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					

记录:

审核:


## 大峡谷隧道 出口右洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 22 日

隧洞名称	大峡谷出口右洞	桩号	K86+731	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKY—062	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		209° ∠42°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状；		裂隙块状；碎裂状		散体状	



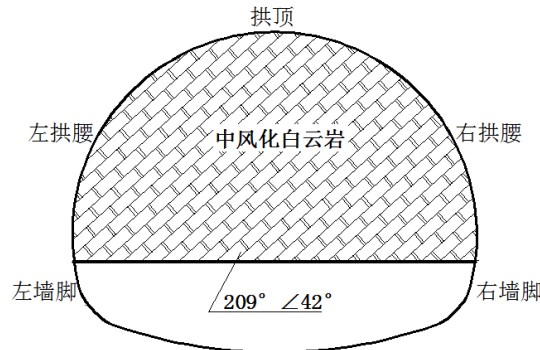

	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
		√									
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					

记录:


审核:

## 大峡谷隧道 出口右洞 开挖面地质素描记录表

日期: 2018 年 09 月 22 日

隧洞名称	大峡谷出口右洞	桩号	K86+731	设计支护类型		Z4C		编号		DXG—CKY—063	
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		208° ∠38°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差			不稳定		极不稳定	
隧洞工程	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩		较软岩		软岩		极软岩	
				√							

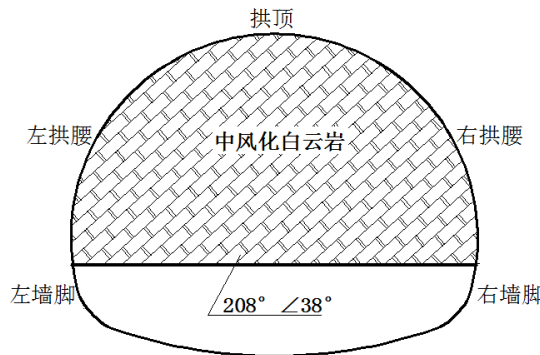

地质条件	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状：		裂隙块状：碎裂状		散体状	
	结构面	1~2（裂隙不甚发育）		2~3（裂隙稍发育）		3（裂隙较发育）		大于 3（裂隙发育）		杂乱无章（裂隙非常发育）	
	发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状	√	粗糙波纹状		有擦痕				平整光滑	
	地质构造影响程度	轻微	√	较重		严重				极严重	
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
			√								
其他（如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质）											
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工，钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	无异常。				
						备注					

记录：


审核：

## 大峡谷隧道 出口右洞 开挖面地质素描记录表

日期：2018 年 09 月 24 日

隧洞名称	大峡谷出口右洞	桩号	K86+726	设计支护类型		Z4C		编号	DXG—CKY— 064		
地层岩性	中风化板岩	围岩类别	设计	IV	实际	IV	岩层、节理裂隙产状		208° ∠38°		
围岩稳定性	稳定		基本稳定	√	稳定性差		不稳定		极不稳定		

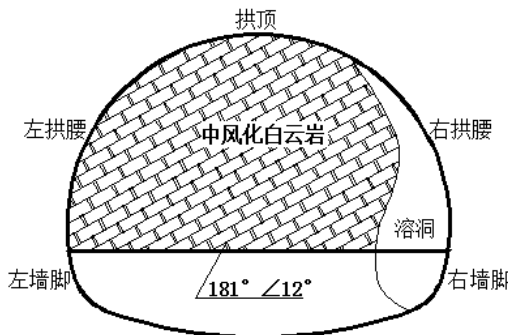

隧洞工程地质条件	岩石坚硬程度	坚硬岩		较坚硬岩 √		较软岩		软岩		极软岩	
	岩体结构类型	巨整体状或巨厚层状		块状或厚层状		裂隙块状或中薄层状; √		裂隙块状; 碎裂状		散体状	
		1~2 (裂隙不甚发育)		2~3 (裂隙稍发育)		3 (裂隙较发育)		大于 3 (裂隙发育)		杂乱无章 (裂隙非常发育)	
	结构面发育程度(组数)					√					
	岩石完整程度	完整		较完整		完整性差		较破碎	√	破碎	
	节理裂隙充填情况	其他充填		钙铁质充填		砂质充填		泥质充填	√	无充填	
	结构面粗糙程度	明显台阶状		粗糙波纹状	√	有擦痕		平整光滑			
	地质构造影响程度	轻微		较重		严重		√	极严重		
	地下水出露情况	干燥	潮湿、湿润 √	渗、滴水		淋雨状		线流状	股状出水	涌、突水	
	其他 (如断层、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质)										
地质素描图						施工方法、主要支护措施及参数	新奥法施工, 钢拱架及锚喷支护。				
						隧道洞内、外地质及支护状况观察综述	掌子面右部出现非充填型溶洞。				
						备注					

记录:

审核:
